



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO
DE
OBRAS E PROCESSOS

FACULDADE DE ENGENHARIA DE ALIMENTOS


Reforma da entrada e distribuição de energia elétrica - DTA/DETA/FEA

RELATÓRIO: dez/22




Obra.....: Reforma da entrada e distribuição de energia elétrica - DTA/DETA/FEA **V. CONTRATO:** R\$ 584.163,68

Empresa.: André Hoffmann Rodrigues **V. CONT. REV.:** R\$ 584.163,68

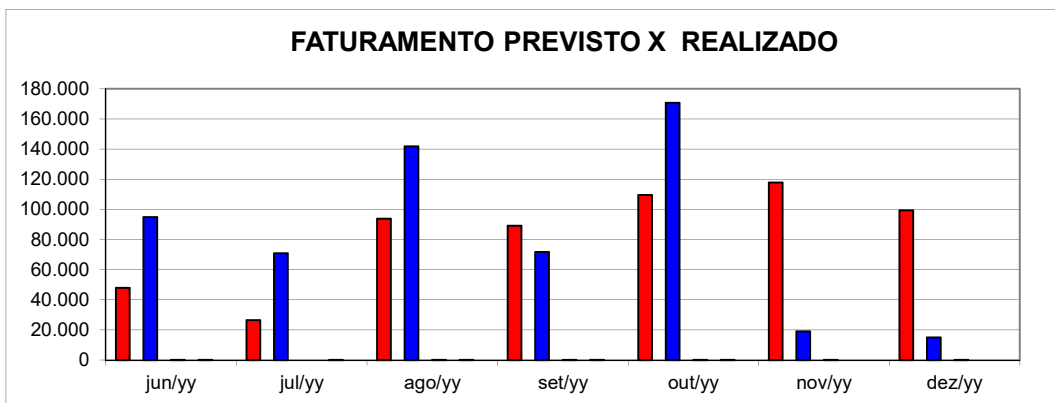

	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Previsto	47.973,21	26.471,10	93.857,30	89.213,32	109.506,84	117.879,43	99.262,49
Previsto Revisado							
Realizado	94.799,52	70.853,22	141.791,31	71.793,72	170.764,98	19.105,59	15.055,34
Realizado Revisado							
Previsto	8,21%	4,53%	16,07%	15,27%	18,75%	20,18%	16,99%
Previsto Revisado							
Realizado	16,23%	12,13%	24,27%	12,29%	29,23%	3,27%	2,58%
Realizado Revisado							

FATURAMENTO ACUMULADO PREVISTO X REALIZADO

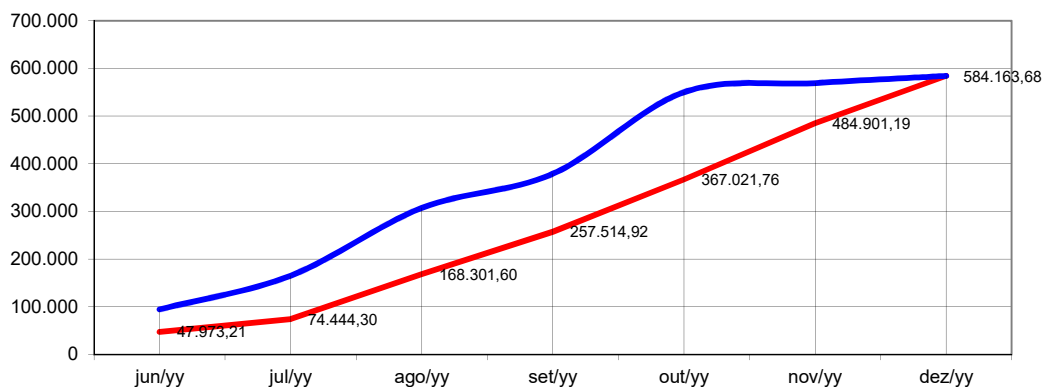

	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22
Previsto	47.973,21	74.444,30	168.301,60	257.514,92	367.021,76	484.901,19	584.163,68
Previsto Revisado							
Realizado	94.799,52	165.652,74	307.444,05	379.237,77	550.002,75	569.108,34	584.163,68
Realizado Revisado							
Previsto	8,21%	12,74%	28,81%	44,08%	62,83%	83,01%	100,00%
Previsto Revisado							
Realizado	16,23%	28,36%	52,63%	64,92%	94,15%	97,42%	100,00%
Realizado Revisado							

OBSERVAÇÃO: OBRA ENTREGUE DENTRO DO PRAZO, CONSIDERANDO INTERRUPÇÕES SOLICITADAS PELA FISCA.



RELATÓRIO DE INTERCORRÊNCIAS

OBRA.....: Reforma da entrada e distribuição de energia elétrica - DTA/DETA/FEA

EMPRESA.: André Hoffmann Rodrigues

ITEM	MOTIVOS	DIAS	%	RESPONSÁVEL	DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)	INOPERÂNCIA CONTRATADA	0	0%	Empresa	28/12/2022
2)	MODIFICAÇÕES SOLICITADAS PELA UNIDADE	0	0%	UNIDADE	
3)	DEMORA NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	0	0%	Empresa	
4)	INTEMPÉRIES (CHUVA REGISTRADA)	0	0%	CHUVAS	
5)	CORREÇÕES E FALTA DE COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS	0	0%	UNICAMP	
6)	ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS ÀS NOVAS NORMAS	12	100%	UNICAMP	
7)	OUTROS - INFILTRAÇÕES DE CHUVA - RESP. UNICAMP	0	0%	UNICAMP	
DIAS DE INTERCORRÊNCIAS		12	100%		

ITEM	ADITAMENTO JUSTIFICAVÉL DE PRAZO	DIAS	ACUM.	RESPONSÁVEL	NOVA DATA PARA TÉRMINO DA OBRA
1)	ABONO CONCEDIDO PELA FISCALIZAÇÃO	18	100%		15/01/2023
2)					
3)					
TOTAL ADITAMENTOS		18	100%		

PREVISÃO DIAS TOTAIS DE ATRASO	0	OBRA CONCLUÍDA EM:	09/01/2023
---------------------------------------	----------	---------------------------	-------------------



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Reforma da entrada e distribuição de energia elétrica - DT/DETA/FEA

EMPRESA: André Hoffmann Rodrigues

Período: 11/2018

FUNDAÇÃO DA OBRA E ESCAVAÇÃO DE VALAS



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Reforma da entrada e distribuição de energia elétrica - DTA/DETA/FEA

EMPRESA: André Hoffmann Rodrigues

Período: 11/2018

INFRAESTRUTURA





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Reforma da entrada e distribuição de energia elétrica - DT/DETA/FEA

EMPRESA: André Hoffmann Rodrigues

Período: 11/2018

SUPERESTRUTURA, REFORMA DE AMBIENTE EXISTENTE E LAJE DE COBERTURA







RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Reforma da entrada e distribuição de energia elétrica - DTA/DETA/FEA

EMPRESA: André Hoffmann Rodrigues

Período: 11/2018

TELHADO, INFRA. ELÉTRICA, EXECUÇÃO DA MÉDIA E BAIXA TENSÃO, SPDA E FINALIZAÇÃO

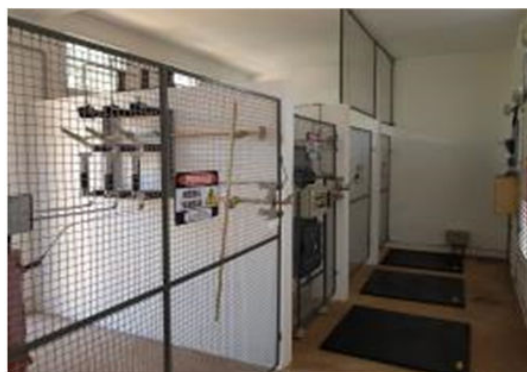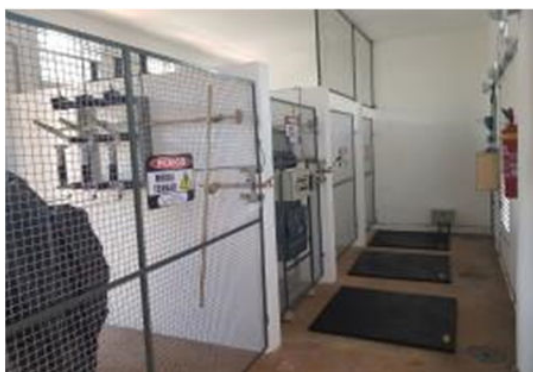

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Reforma da entrada e distribuição de energia elétrica - DT/DETA/FEA

EMPRESA: André Hoffmann Rodrigues

Período: 11/2018

TELHADO, INFRA. ELÉTRICA, EXECUÇÃO DA MÉDIA E BAIXA TENSÃO, SPDA E FINALIZAÇÃO






RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Reforma da entrada e distribuição de energia elétrica - DTA/DETA/FEA

EMPRESA: André Hoffmann Rodrigues

Período: 11/2018

TELHADO, INFRA. ELÉTRICA, EXECUÇÃO DA MÉDIA E BAIXA TENSÃO, SPDA E FINALIZAÇÃO

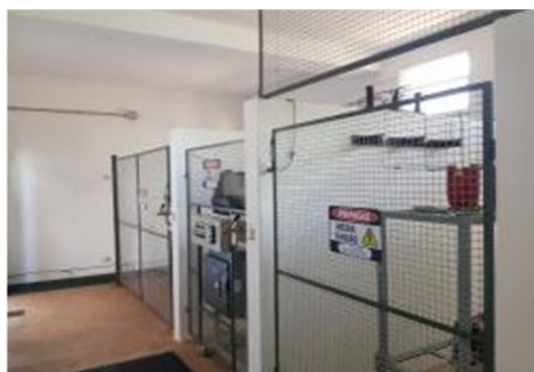



Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Faculdade de Engenharia de Alimentos
Engenharia e Manutenção



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: Reforma da entrada e distribuição de energia elétrica - DTA/DETA/FEA

EMPRESA: André Hoffmann Rodrigues

Período: 11/2018

OBRA CONCLUÍDA

